

# PROGETTO AULE PULITE


I.C. DI VONA - SPERI



**RIUNIONE ORGANIZZATIVA**  
**dalle 18.00 alle 19.30**  
**in Auditorium**

- **i genitori** delle elementari delle medie nei primi mesi dell'anno scolastico **hanno esposto alla dirigenza scolastica la necessità di una nuova imbiancatura** delle aule scolastiche.
- nella seduta del **Consiglio di Istituto** del 4 febbraio 2015 è stato costituito un **gruppo di lavoro** per regolamentare l'esecuzione dei lavori di imbiancatura delle aule e per valutare:
  - ✓ costi del materiale,
  - ✓ stipula di un'assicurazione per l'esecuzione dei lavori,
  - ✓ possibilità di ottenere un contributo da parte del Comune di Milano,
  - ✓ scelta del colore.
- **componenti** del gruppo di lavoro:
  - per i **docenti**: Nicola Guida (primaria) e Paolo Molena (media)
  - per i **genitori**: Elisabetta Mezzolo (prim.) e Laura Coletta(media)
  - Per la **dirigenza**: il Dirigente Giuseppe Losio e il DSGA Luciano Fani.

- Il gruppo si è riunito il **17 febbraio** e il **18 marzo** e successivamente sono stati fatti diversi sopralluoghi presso le aule delle elementari e delle medie.
- I lavori del gruppo hanno chiarito che:
  - ✓ Il Comune contribuisce al progetto attraverso la fornitura del materiale per l'imbiancatura delle aule dell'Istituto.
  - ✓ La **disponibilità dei volontari** è di **86** per il comitato TS e di **76** per l'Associazione QdV.
  - ✓ l' **assicurazione scolastica** già prevede la **copertura anche per i genitori**, devono solo essere forniti alla compagnia i dati delle persone presenti a scuola nelle giornate dedicate ai lavori.

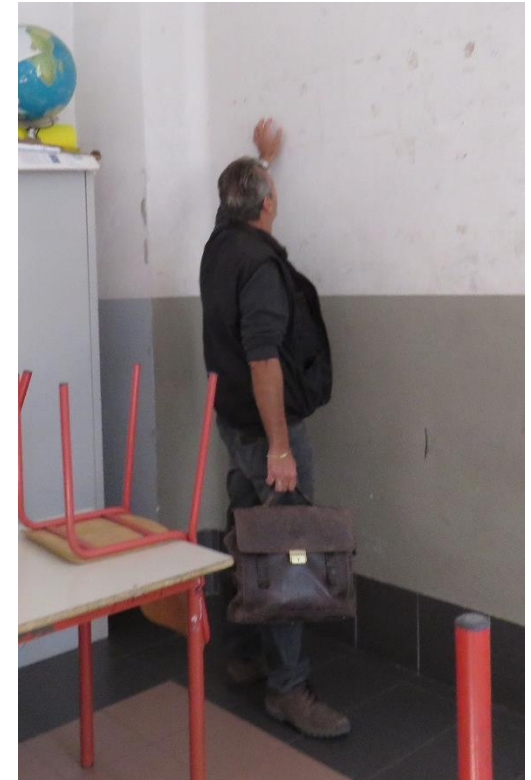

# le 36 aule delle medie



piano	tot. aule
T	4
1°	11
2°	13
3°	8
tot.	36

Alcune aule hanno una cornice in alto, altre no. La parte in basso è smaltata e quella superiore in pittura murale.

**Il fissativo/consolidante NON va dato sulle parti smaltate.**




in quasi tutte le aule ci sono molte crepe a ragnatela, segni di scotch e aree da da stuccare... in 3 classi ci sono dei murales da coprire



In altre aule gli interventi vanno oltre la piccola stuccatura e il **ripristino murario verrà effettuato da una ditta inviata dal Comune di Milano** che li farà tra il 27 e il 29 aprile in orario pomeridiano.






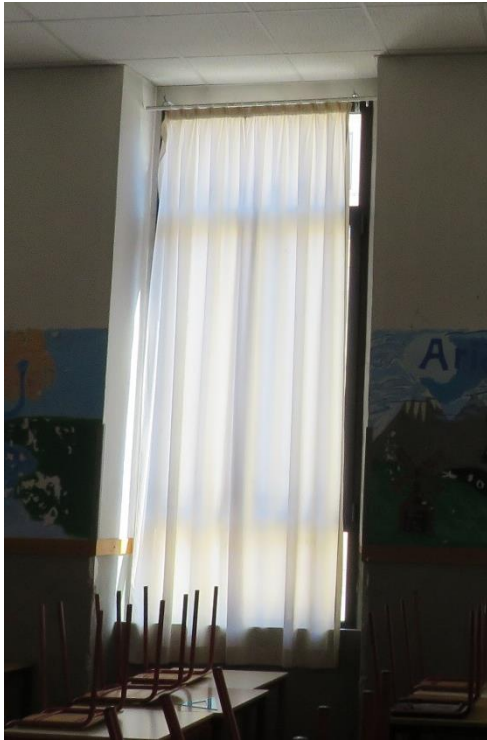

Le tende sono di varie tipologie, in stoffa a vetro o a bastone, veneziane e in alcune classi soluzioni creative con fogli di giornale a vetro!  
**Per quelle in stoffa questa sarà un'ottima occasione per essere lavate!**  
Useremo la lavatrice della scuola.

# La scelta del colore

Nella mazzetta colori proposta dalla ditta mandata dal Comune di Milano sono state individuate 3 tinte in base ai colori dalla pavimentazione e delle porte dell'istituto. Il 10 aprile, in un aula al PT, è stata fatta una prova dei colori e nei giorni successivi, sentite diverse persone tra docenti e non, la scelta è concordemente ricaduta sulla tinta B1115

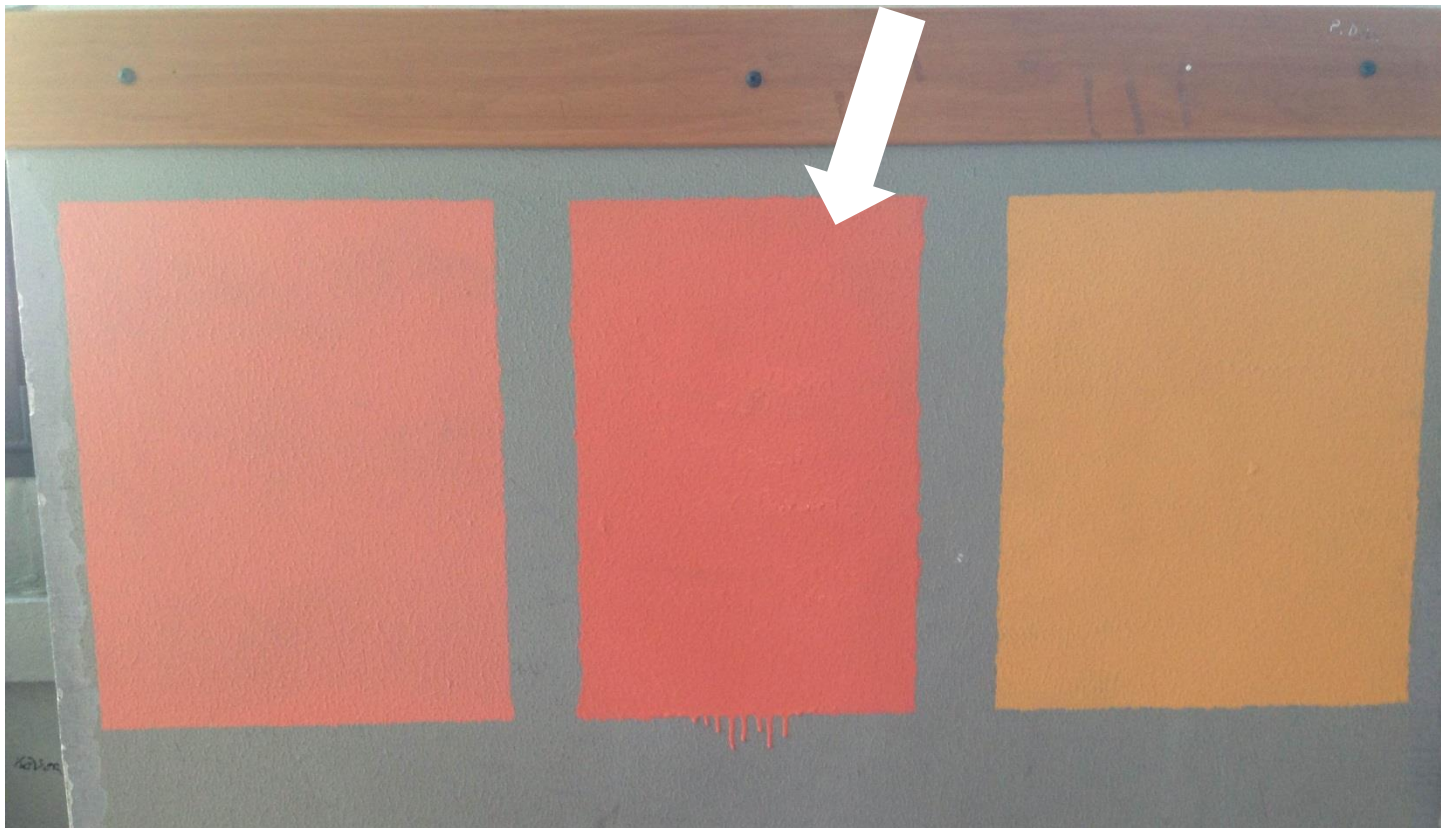



# «aule pulite» programmazione dei lavori sulle 36 aule della QdV

aule	pomeriggio 30/04/2015	mattina 01/05/2015		pomeriggio 01/05/2015	mattina 2/5/2015		pomeriggio 01/05/2015	mattina 2/5/2015		pomeriggio 01/05/2015
1	1	1		1		5				
2	2	2		2		6				
3	3	3		3		1				
4	4	4		4		2				
5	5	5		5		3				
6	1	6		6		4				
7	2	7		7		5				
8	3	8		8		6				
9	4		1		1		1			
10	5		2		2		2			
11		1	3		3		3			
12		2	4		4		4			
13		3	5		5		5			
14		4	6		6		6			
15		5	7		7			1		
16		6	8		8			2		
17		1			1		3		1	
18		2			2		4		2	
19		3			3		5		3	
20		4			4		6		4	
21		5			5		1		1	
22		6			6		2		2	
23		1			7		3		3	
24		2			8		4		4	
25		3			1		5			1
26		4			2		6			2
27		5			3		1			3
28		6			4		2			4
29		1			5		3			1
30		2			6		4			2
31		3			7		5			3
32		4			8		6			4
33		5				1		1		1
34		6				2		2		2
35					1	3		3		3
36					2	4		4		4

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^ mano bianco/smalto

2^ mano bianco/colore

# Il programma dei lavori per le medie

- **nella settimana dal 20 al 24 aprile:**  
docenti e alunni libereranno le pareti dai lavori appesi ai muri e svuoteranno i loro armadi.

**ATTENZIONE:** ai **rappresentanti** di classe verrà chiesto di collaborare fornendo già da **lunedì 20** un adeguato numero di **scatoloni** per il materiale didattico attualmente contenuto nei 2 – 3 della propria classe.



# Il programma dei lavori per le medie

- **giovedì 30:** dalle 14:30 alle 18:30 alcune squadre di volontari prepareranno una decina di aule (l'elenco preciso delle aule verrà indicato nei giorni precedenti i lavori):



- **stuccando** dove necessario,
- rimuovendo le **tende in stoffa** (da mettere in sacchetti per l'invio al lavaggio)
- **coprendo con teli** di plastica le lavagne, gli infissi, i caloriferi
- **nastrand** le parti da proteggere dall'imbiancatura (parte alta cornice o controsoffitto, parte superiore e inferiore delle bordature in legno, parte in alto della zoccolatura)
- **spostando gli arredi** al centro della stanza e in corridoio, se necessario.



aule	pomeriggio	mattina 01/05/2015		
	30/04/2015			
1	1	1		1
2	2	2		2
3	3	3		3
4	4	4		4
5	5	5		5
6	1	6		6
7	2	7		7
8	3	8		8
9	4		1	
10	5		2	
11		1	3	
12		2	4	
13		3	5	
14		4	6	
15		5	7	
16		6	8	
17		1		
18		2		
19		3		
20		4		
21		5		
22		6		
23		1		
24		2		
25		3		
26		4		
27		5		
28		6		
29		1		
30		2		
31		3		
32		4		
33		5		
34		6		
35				
36				

## venerdì 1° Maggio – nella mattina

- le **6 squadre** di preparazione prepareranno 6 aule
- le **8 squadre** di imbiancatura, composte da 3 volontari ciascuna inizieranno in contemporanea a dare la mano di **fissativo / consolidante** nelle 8 aule preparate il giorno precedente.
- **finita la prima fase**, le squadre di preparazione passeranno ad altre aule e quelle di imbiancatura si sposteranno nelle nuove 8 aule preparate per dare la mano di fissativo/consolidante
- **finita la seconda fase** le squadre di preparazione passeranno ad altre aule e quelle di imbiancatura a dare la prima mano alle prime aule

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^ mano bianco/smalto


2^ mano bianco/colore

	pomeriggio
aule	01/05/2015
9	1
10	2
11	3
12	4
13	5
14	6
15	7
16	8
17	1
18	2
19	3
20	4
21	5
22	6
23	7
24	8
25	1
26	2
27	3
28	4
29	5
30	6
31	7
32	8
33	
34	
35	1
36	2

## venerdì 1° Maggio – nel pomeriggio

- **2 squadre** di preparazione prepareranno le ultime 2 aule se non già preparate nella mattina
- le **8 squadre** di imbiancatura, proseguiranno a dare la prima mano alle successive 8 aule
- finita la prima mano alle prime 16 classi, le squadre di imbiancatura passeranno in nuove 8 aule preparate per dare la mano di fissativo/consolidante
- finita la seconda fase le squadre di preparazione passeranno ad altre aule e quelle di imbiancatura a dare la prima mano alle prime aule

### legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^ mano bianco/smalto


2^ mano bianco/colore

aule	mattina 2/5/2015	
1	5	
2	6	
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9		1
10		2
11		3
12		4
13		5
14		6
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	1	
34	2	
35	3	
36	4	

## sabato 2 Maggio – nella mattina

- **delle 6 squadre** di imbiancatura, composte da 3 volontari ciascuna 4 squadre daranno la mano di **fissativo / consolidante** nelle ultime 4 aule preparate il giorno precedente e le altre 2 la seconda mano di bianco/smalto nelle prime due aule
- **finita la prima fase**, le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la seconda mano di bianco/smalto
- **finita la seconda fase** le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la seconda mano di bianco/smalto

legenda



preparazione

fissativo/consolidante



1^mano bianco/smalto

2^ mano bianco/colore



## sabato 2 Maggio – nel pomeriggio

aule	pomeriggio o 01/05/2015
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	1
16	2
17	3
18	4
19	5
20	6
21	1
22	2
23	3
24	4
25	5
26	6
27	1
28	2
29	3
30	4
31	5
32	6
33	
34	
35	
36	

- la **squadra** (*criticità per presenza di pochi volontari*) per la preparazione potranno iniziare a ripristinare le prime 16 aule
- **delle 6 squadre** di imbiancatura, 2 daranno 2 la seconda mano di bianco/smalto alle due aule rimanenti, le altre 4 squadre daranno la 1 mano di bianco/smalto
- **finita la prima fase**, le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la prima mano di bianco/smalto
- **finita la seconda fase** le 6 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 6 aule per dare la prima mano di bianco/smalto

legenda



preparazione

fissativo/consolidante







1^mano bianco/smalto

2^ mano bianco/colore

aule	mattina 2/5/2015	pomeriggio o 01/05/2015
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17	1	
18	2	
19	3	
20	4	
21	1	
22	2	
23	3	
24	4	
25		1
26		2
27		3
28		4
29		1
30		2
31		3
32		4
33	1	1
34	2	2
35	3	3
36	4	4

## domenica 3 Maggio – mattina/pomeriggio

- **le 4 squadre** di imbiancatura, partiranno col dare la prima mano di bianco/smalto alle ultime 4 aule rimanenti,
- **finita la prima fase**, le 4 squadre si sposteranno a rotazione a dare la seconda mano di bianco/smalto alle successive 8 aule
- **nel pomeriggio** le 4 squadre di imbiancatura si sposteranno nelle successive 8 aule per finire la seconda mano di bianco/smalto
- la **squadra** (*criticità per presenza di pochi volontari*) per la preparazione potranno iniziare a ripristinare le aule che man mano vengono pronte

legenda		preparazione		1^mano bianco/smalto
		fissativo/consolidante		2^ mano bianco/colore

## attrezzatura necessaria per l'imbiancatura

- SPATOLE
- PENNELLI
- PENNELLESSE
- PROLUNGA PER RULLI
- RULLI per smalto
- RULLI PER idropittura
- RETE PER RULLI Cm 25X25
- SECCHI PER MISCELARE IL MATERIALE
- TRABATELLI

Sulla base del materiale reperito tra genitori ed insegnanti, avremo un'idea del quantitativo di attrezzi mancanti da acquistare a spese dell'associazione e del Comitato.

**SI RICORDA che a fine lavori ognuno potrà recuperare il proprio materiale!**





# attrezzatura reperita e da reperire

attrezzatura in prestito:

Elenco materiale dei volontari:	
1 trabatello, 2 rulli per idropittura, 2 bastoni prolunga per rullo, 2 pennellesse, 3 pennelli, 1 rete per rulli	Laura Trasi (2 N)
3 rulli per idropittura 2 pennelli 3 pennellesse 2 reti	Francesco Truci (2 B)
1 penellessa, 1 rullo 1 bastone 1 secchio	Carlo Vaiani (2N)
2 spatole (di quelle non molto grandi con manico) 1 rullo per idropittura in discrete condizioni (+ rulli piccoli per bordi/finiture) 1 Rete per rulli 1 Scala	Andrea Bignazzi (1)

maggior materiale reperiremo e minore sarà l'importo a cui dovranno far fronte associazione e comitato per l'acquisto dell'attrezzatura.

**ATTENZIONE: termine ultimo per comunicare la disponibilità di attrezzatura**

**venerdì 24 aprile**

occorrenti	materiale dei genitori	n.	da acquistare	prev.
8	PENNELLO	5	3	€ 10,46
8	PENNELLESSA	6	2	€ 10,43
16	PROLUNGA RULLO	3	13	€ 50,56
16	RULLO RASATO per smalto		16	€ 96,00
24	RULLO POLYAM PER idropittura	7	17	€ 284,07
16	RETE PER RULLO Cm 25X25	4	12	€ 32,26
16	SECCHI PER MISCELARE IL MATERIALE	1	15	€ 21,59
10	SPATOLA	2	8	€ 11,51
	<b>Spesa preventivata</b>			<b>€ 505,36</b>
	TRABATELLO	1		
	SCALA	1		

# Volontari per le fasi di preparazione e post imbiancatura

	gruppo	classe	nome	cognome	30-apr	01-mag	02-mag	03-mag	
1	1	1N	LAURA	CARA	1	1	1*		
2	1	2A	NORBERTO	VILLA	1	1	1*		
3	1	1E	FRANCESCA	LISE	1				
4	1	1G	LAURA	ZOLLO				1	
5	1	2G	CARLOS FEDERICO	TIRADO GUTIERREZ				1	
6	2	1D	SILVIA	SISTI		1			
7	2	1D	GIANFRANCO	BECCIU		1			
8	2	3D	DANIELA	CATTANEO		1			
9	2	1N	MARTINA	VIKTORINOVA		1			
10	3	3C	JENNIFER	FERLEZ	1*	1			
11	3	3C	GIOVANNA	LANCIANO		1			
12	3	1F	FRANCESCA	FEDERICI		1			
13	3	1F	FULVIO	ZANESSI		1			
14	4	2H	ALESSANDRO	BORRONI		1			
15	4	2D	MAURIZIO	BELMUSO		1			
16	4	2D	ANNA	CARUSI		1			
17	4	2N	BARBARA	CORSI		1			
18	5	1N	GIULIA	LABELLA	1*	1			
19	5	2C	NICOLETTA	COSSIO		1			
20	5	2C	LUCIANO	MARINO		1			
21	5	1C	RAFFAELE ROBERTO	FARINA		1			
22	6	3B	SIMONA	PALERMO	1	1			
23	6	1I	CINZIA ERMINIA	CALLEGARO		1			
24	6	1B	EDA	BERTOSSI	1	1			
25	6	1L	ANTONIO GIOVANNI	BANAL	1				
26	7	3M	ROSSELLA	AZZOLINI	1		1		
27	7	2L	LUCIA	VILLANOVA	1*		1		
28	7	1F	SIMONA	TRADATI	1				
29	7	1L - 3L	GIUSEPPE	PAOLETTI	1				
30	8	1L - 3L	FRANCESCA	PERUGINO	1				
31	8	1L	Natalia	D'Ambrosio	1				
32	8	1L	Attilio	De Gennaro	1				
33	8	1L	Alessandro	De Gennaro	1				
34	9	3H	LUISA	BONGIONI	1				
35	9	3H	CHIARA	BERARDI	1				
36	36	3I -2I	ANGELA	CATURANO			1	1	
					tot.	15	21	2	2

\* da confermare

n° squadre	4/5	6	2	1
------------	-----	---	---	---

# Volontari per l'imbiancatura

	gruppoclasse	nome	cognome	01-mag	02-mag	03-mag	
1	1	3M	<b>GIOVANNI</b>	<b>MARAZZA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2	1	1I	ALDO	FUGAZZA	1		1
3	1	2M	PAOLA	PRONI	1		1
4	1	3G	OMAR	RICO PATINO	1		
5	1	1A	SAVERIO FRANCESCO	RUSSO		1	
6	1	1G	MAURIZIO	TOLOI		1	
7	1	1L-G	STIJN	VRIENDS			
8	2	2B	<b>FRANCESCO</b>	<b>TRUCI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
9	2	1E	MATTEO	CASTELLUCCI			1
10	2	1M	NICOLETTA	MONETA		1	
11	2	2D	MARCO	CAPOZZI	1		
12	2	3D	RAUL WILSON	ABANTO PALOMINO			1
13	2	3H	CHIARA	BERARDI	1*		
14	2	2G	PASQUALE	DI MONACO	1	1	
15	3	1G	<b>MASSIMO</b>	<b>BOLCATO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	3	1G	MATTEO GIOVANNI	BRIOLA	1	1	
17	3	3B	MONICA	ANGELONI	1	1	
18	3	1E	MATTEO	CASTELLUCCI			1
19	3	1D	AHMED ABDELGHANI KHALIL	IBRAHIM			1
20	4	2L	<b>STEFANIA</b>	<b>BENINI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
21	4	1F	ROBERTO	ASPES			1
22	4	1E	RAFFAELE	REGGIO	1		
23	4	1E	GIULIA	TAMAI			1
24	4	1I	ANDREA	BIGNAZZI	1	1	
25	4	2E	FILIPPO	MURA		1	
26	5	1F	<b>SIMONA</b>	<b>TRADATI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
27	5	1A	GIUSEPPE	VICENTI	1	1	
28	5	1A	VIVIANA	BERTACCA	1	1	
29	6	1N	<b>LUCA</b>	<b>VESPIGNANI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
30	6	1F	GABRIELLA	CRESPI	1		
31	6	1F	MASSIMO	MOIOLI	1		
32	6	1H	ROCHI FEBO	DOMMARCO		1	
33	6	1H	ANTONIO	SISINNI		1	
34	7	1A	CLAUDIA	FUSI	1		
35	7	2N	LAURA MARIA	TRASI	1		
36	7	1B	MAURIZIO	FLOREAN	1		
37	8	1F	ANDREA	DELLA SANTA	1		
38	8	2C	GIULIANO	CIPOLLETTA	1		
39	8	2N	CARLO	VAIANI	1		
40	8	2N	ANTONINO	CINGARI			
				tot.	25	18	13

\* da confermare

n° squadre	8	6	4
------------	---	---	---
